

## MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 22/03/2019 al 31/12/2019

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - Via Paludi 15/A - Castelfrentano



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente nel periodo 22/03/2019 – 31/12/2019 è circolata:


Corrente media: 551,4 A

Massima mediana della corrente: 1376,5 A

Primo dato ore 00:00 del 22/03/2019

Ultimo dato ore 23:59 del 31/12/2019

Bollettino sintetico del periodo dal 22/03/2018 al 31/12/2019

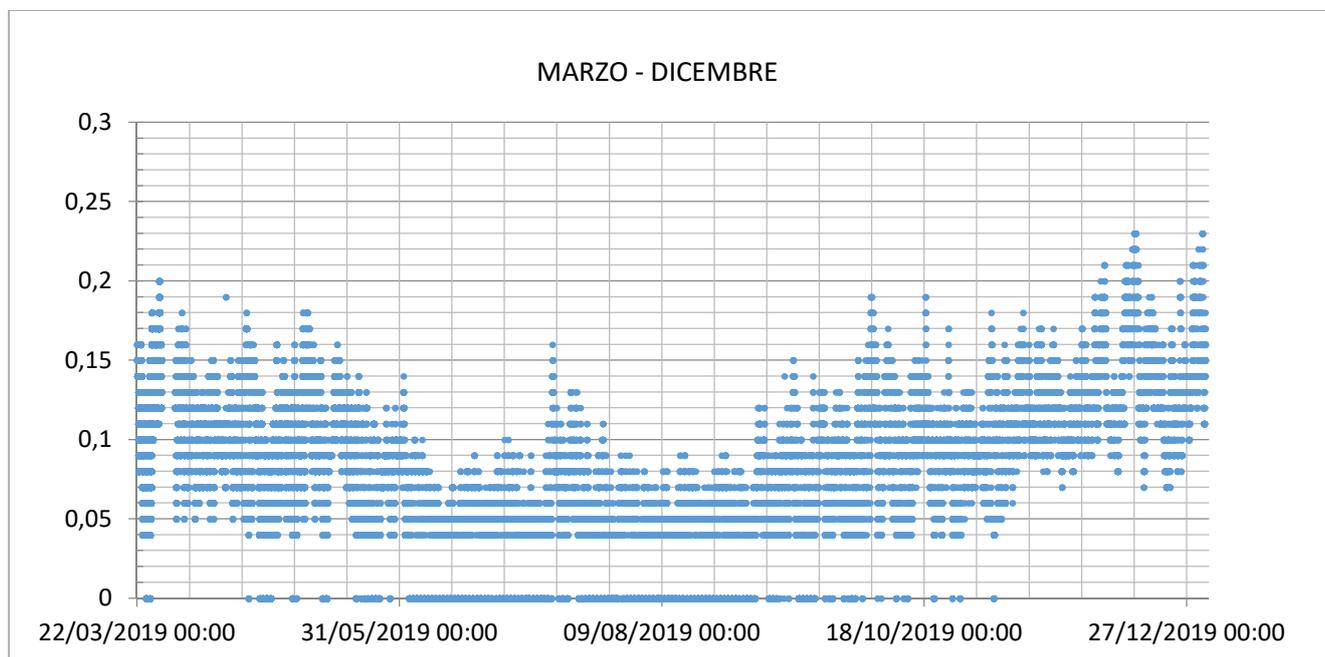

**Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in via Via Paludi 15/A a Castelfrentano.**

|                           | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Valore massimo            | 0.19  | 0.19   | 0.18   | 0.18   | 0.14   | 0.16   | 0.48      | 0.19    | 0.18     | 0.23     |
| Valore medio              | 0.10  | 0.10   | 0.03   | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.08      | 0.10    | 0.11     | 0.14     |
| Valore minimo             | 0.04  | 0.04   | 0.01   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04      | 0.04    | 0.04     | 0.07     |
| Massima mediana nelle 24h | 0.14  | 0.12   | 0.15   | 0.08   | 0.10   | 0.07   | 0.11      | 0.14    | 0.14     | 0.19     |

| <b>Confronto con i limite di legge</b>    |         |
|---|---------|
| Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003) | 3.00 µT |
| Massima mediana sulle 24ore               | 0.19 µT |

