

## MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 01/04/2020 al 31/07/2020

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - Via Paludi 15/A - Castelfrentano



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente nel periodo 01/04/2020 – 31/07/2020 è circolata:


Corrente media: 485 A

Massima mediana della corrente: 1175.5 A

Primo dato ore 00:00 del 01/04/2020

Ultimo dato ore 23:59 del 31/07/2020

Bollettino sintetico del periodo dal 01/04/2020 al 31/07/2020

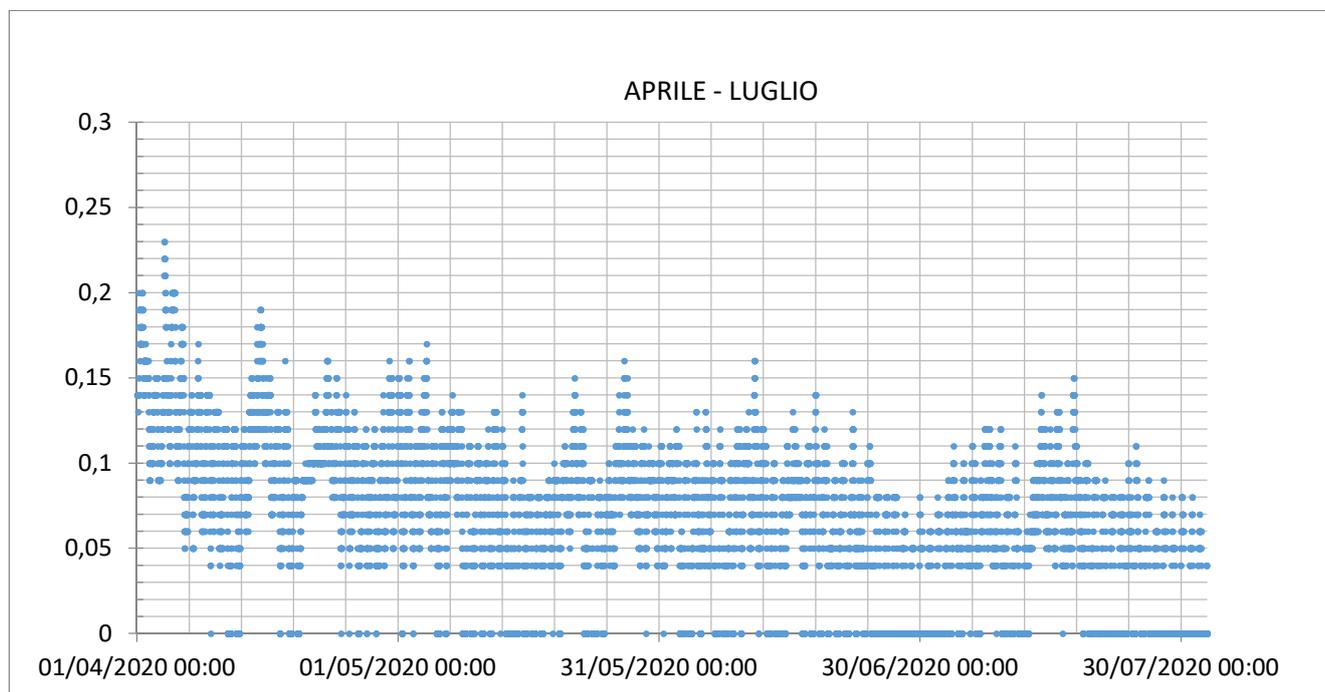

**Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in via Via Paludi 15/A a Castelfrentano.**

	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
<b>Valore massimo</b>	<b>0.23</b>	<b>0.17</b>	<b>0.16</b>	<b>0.15</b>
<b>Valore medio</b>	<b>0.11</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.07</b>
<b>Valore minimo</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>Massima mediana nelle 24h</b>	<b>0.16</b>	<b>0.11</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>

<b>Confronto con i limite di legge</b>	
<b>Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)</b>	<b>3.00 <math>\mu</math>T</b>
<b>Massima mediana sulle 24ore</b>	<b>0.16 <math>\mu</math>T</b>

